

城建重点工程进度 20220325

截止到 2022 年 3 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建 A-H 共 8 条匝道，总长约 2.58km，其中桥梁匝道 3 座，全长 630.25 米。改造及新建通道共 4 处。主要建设内容为：桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋。		
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019 年 11 月		
	可研批复投资	38250 万元	初设批复投资	38385 万元
	财政评审投资	14172.51 万元	工程费用	12641.7 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程：桩基累计完成 94 根（94 根），占比 100%；承台累计完成 24 座（24 座），占比 100%；墩柱（台）累计完成 24 座（24 座），占比 100%；现浇箱梁累计完成 4 联（4 联），占比 100%；钢箱梁架设完成 1 联（2 联），占比 50%；防撞护栏累计完成 460.2m（1152.5m）占比 40%。</p> <p>2、路基土石方工程：开挖累计完成 57 万 m³（57 万 m³），占比 100%；路基土石方填筑累计完成 6.7 万 m³（6.7 万 m³），占比 100%；道路基层累计完成 3.06 万 m²（3.61 万 m³），占比 84%；道路面层累计完成 4.07 万 m²（5.17 万 m³），占比 78.7%。</p> <p>3、其他：箱涵累计完成 4 座（4 座），占比 100%；A、G 匝道已开放试通行；E 匝道已竣工验收并完成移交；F 匝道已开放试通行。</p> <p>4、绿化工程：A、G、E、F 匝道绿化施工完成。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：200 万元，其中工程费用 200 万元； 年度完成投资：850 万元，其中工程费用 850 万元； 累积完成投资：12982 万元，其中工程费用 8737 万元； 累积完成工程费用的 69%。		

项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



2、三峡快速路互通立交-花溪路节点互通工程:


项 目 基 本 信 息	工程简介	三峡快速路互通立交-花溪路节点互通工程总规划建设8条匝道,本次施工范围分别为A、B、C、D、E、F、G、JS匝道,三峡高速方向主线全长约2.606km;花溪路相交路方向全长约0.701km。主要建设内容有:道路工程、桥涵工程、排水工程、电力管沟等综合管线工程、附属工程(照明、交通及治安监控等)的管路预埋及设备基础。		
	施工单位	中铁大桥局集团有限公司		
	监理单位	湖北三峡建设项目管理股份有限公司		
	开工日期	2020年12月		
	可研批复投资	51003万元	初设批复投资	49932万元
	财政评审投资	49900万元	工程费用	23111.1万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、道路部分</p> <p>(1)土石方开挖累计完成135万方(143万方),占比90.3%;路基填方累计完成4.3万方(6万方),占比72%;边坡防护完成3.9万m²,占比43%(变更);</p> <p>(2)E匝道完成100%,现已开通;</p> <p>(3)A、C匝道路沥青完成70%;</p> <p>(4)B匝道路基成形完成80%;</p> <p>(5)D匝道水稳层完成60%;</p> <p>(6)F匝道F0+390-530段水稳摊铺完成70%,F下穿箱涵混凝土调平层浇筑完成100%;</p> <p>(7)JS匝道JSK0+000-440沥青完成100%,JSK0+440-780沥青完成70%,JSK0+880 JSK1+120段路基填筑完成100%;</p> <p>(8)GK0+000-300段水稳及边沟施工完成,G匝道GK0+000-120、GK0+400-560边坡预应力锚索框格梁完成100%,GK0+360-520生态挡墙完成60%,GK0+420-520加筋土路基完成20%。</p> <p>2、桥梁工程</p> <p>(1)下部结构:桩基累计完成59根(59根),占比100%;承台累计完成17座(17座),占比100%;墩柱累计完成9座(9座),占比100%;桥台累计完成6座(8座),占比75%;桥梁支座安装累计完成34个(42个),占比81%。</p> <p>(2)上部结构:JS匝道桥上部结构预制、安装累计完成8片,占比100%,FL1联现浇梁混凝土浇筑完成100%,HL1联现浇梁浇筑完成100%,BL1联钢梁加工完成40%。</p> <p>(3)桥面系及附属:JS匝道桥防撞护栏完成168m占比100%,JS匝道桥桥台搭板浇筑完成占比100%;F匝道桥防撞护栏完成176m占比92.6%,H匝道桥防撞护栏完成212m占比93.8%。</p> <p>3、排水工程</p> <p>(1)YJ2结合箱3.5×6m箱涵施工完成100%;</p> <p>(2)YB5-YB6斜坡段2×2.25m箱涵底板浇筑完成100%;</p>		

		(3) $\phi 2000$ 雨水管安装完成 280m, 占比 100%; $\phi 400$ 污水管安装 420m, 占比 90%。 4、结构工程 (1) H 下穿通道累计完成占比 50%; (2) F 下穿通道累计完成占比 100%。
	征迁情况	无
	完成投资	当月完成投资: 952 万元, 其中工程费用 952 万元; 年度完成投资: 2875 万元, 其中工程费用 2875 万元; 累积完成投资: 16897 万元, 其中工程费用 13465 万元; 累积完成工程费用的 58.3%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



3、三峡快速路互通立交-港窑路节点互通工程:


项 目 基 本 信 息	工程简介	本工程沿三峡快速路主线约 1.68km, 港窑路 0.83km, 主要建设内容为新建全互通匝道 8 条, 集散车道 2 条, 桔乡路与港窑路互通上下匝道 2 条。匝道及集散车道全长 4.57km, 其中桥梁 2.01km, 路基匝道 2.56km。主要建设内容有: 道路工程, 桥涵工程, 排水工程, 电力管沟等综合管线工程, 附属工程(照明、交通及治安监控等)的管路预埋及设备基础等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2021 年 1 月		
	可研批复投资	52373.24 万元	初设批复投资	47985 万元
	财政评审投资	29534.4 万元	工程费用	27425.9 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、桥梁工程: 桩基累计完成 401 根(409 根), 占比 98.3%; 承台累计完成 80 座(111 座), 占比 72.1%; 桥台墩完成 56 座(114 座), 占比 49.1%。现浇砼箱梁累计完成 6 联(29 联), 占比 20.7%; 钢箱梁完成 1 联(4 联), 占比 25%。 2、土石方: 土石方累计完成 60.8 万方, 占比 92%。 3、道路工程: 边坡支护累计完成 3.4 万平方(7.9 万平方), 占比 43%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资 1428 万元, 其中当月工程费用 1428 万元; 年度完成投资 2428 万元, 其中年度工程费用 2428 万元; 累积完成投资 19445 万元, 其中累计工程费用 11522 万元(含预付款); 累计完成工程费用的 42%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

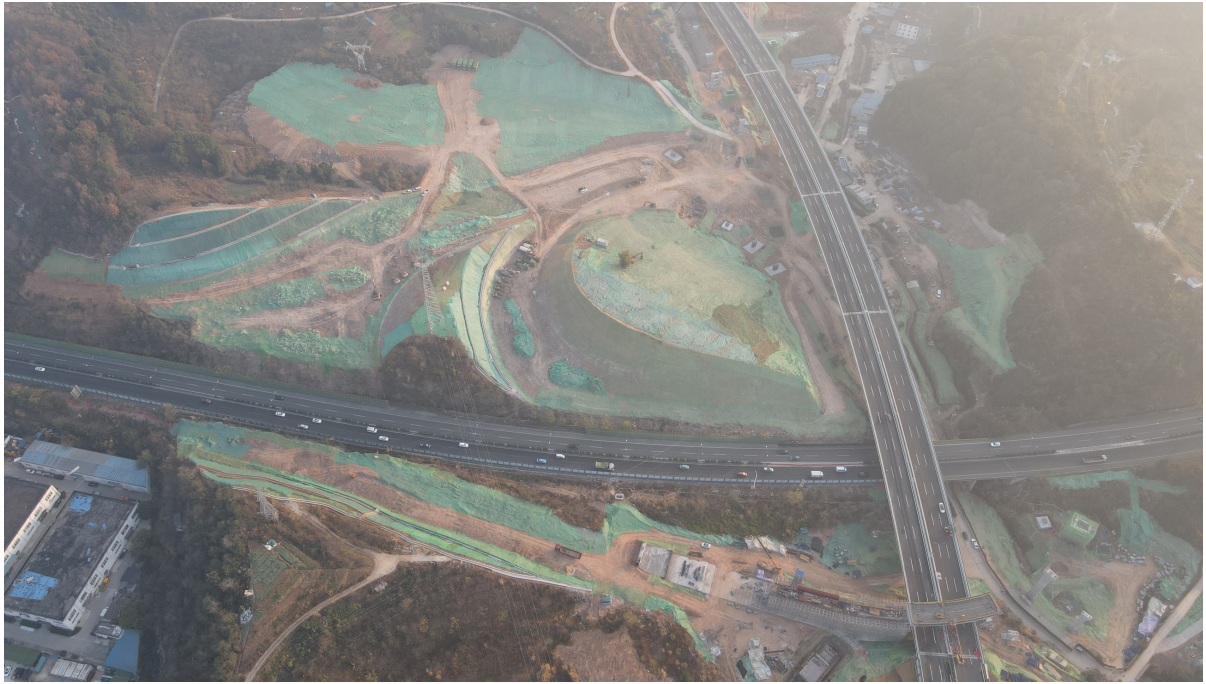

4、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。		
	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司		
	监理单位	重庆市工程管理有限公司		
	开工日期	2016 年 12 月		
	可研批复投资	136892 万元	工程费用	74800 万元
工 程 形 象	建设进度	<p>一、截污工程：截污一期已完工；截污二期求索溪清淤累计完成 90%，三角区污水管网改造完成 90%。</p> <p>二、市政配套工程</p> <p>(1) 道路工程：1#路、6#路、7#路、8#路沥青摊铺已完成、标线喷设完成；8#路延伸段沥青摊铺完成，正在进行路沿石调整。</p> <p>三、生态修复工程</p> <p>水体生态修复：对沙河流域进行水草补栽。</p>		

进 度		四、驳岸、溢流坝工程 (1) 驳岸绿化: ①正在进行苗木的补栽及更换, 绿化整体累计完成 98%, 正在进行整改及品质提升工作。 五、景观公园工程 景观公园工程完成土石方、苗木、种植、构筑物占比约 96%。浮桥完成 98%。已结合现场实际, 开展品质提升工程。 六、电力迁改工程 箱涵隧道累计完成 630 米形象进度 70%。
	征迁情况	无
	完成投资	当月完成投资: 840 万元, 其中工程费用: 840 万元 年度完成投资: 2176 万元, 其中工程费用: 2176 万元 累计完成投资: 69775 万元, 其中工程费用: 69775 万元 累计完成工程费用 93.2%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无

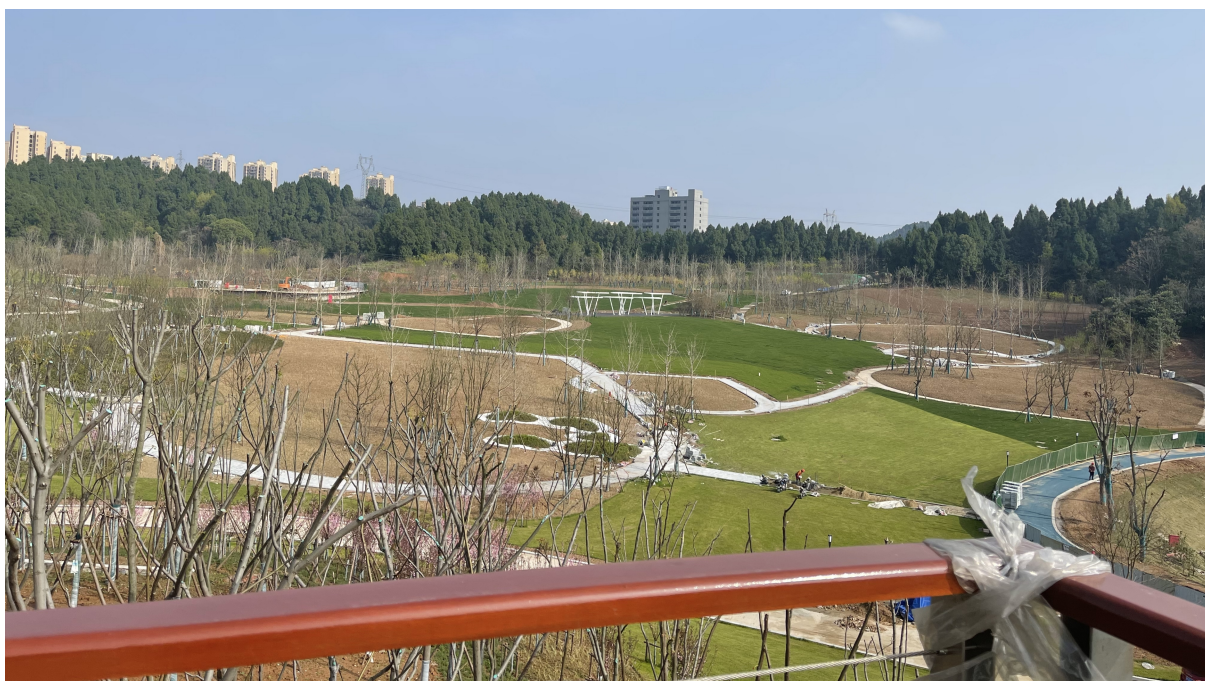

5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长 11.25km（其中将军路管廊有 1.7km 及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给 PPP 项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长 6.37km。</p>		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
		湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）		
		重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）		
	开工日期	2017 年 11 月		
	可研批复投资	194413 万元	初设批复投资	187316 万元
财政评审投资	126068.68 万元（不含征迁补偿费及贷款利息）	工程费用	规模调整后：68053 万元	
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>牌坊坡路：累计完成管廊结构 1836 米（100%），廊内整体安装进度 98%；已完成道路预验收。</p> <p>南站路管廊：累计完成管廊结构 1742 米（88%），廊内整体安装进度 85%。隧道掘进 210m、二衬浇筑 210m、仰拱浇筑 162m。</p> <p>点军路：累计完成管廊结构 2114.7 米（100%），廊内整体安装进度 100%；道路累计完成沥青摊铺 2763 米（100%）。已完成管廊及道路预验收。</p> <p>将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工 1130 米（100%），廊内整体安装进度 100%，已完成预验收。</p> <p>江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工 2264 米（100%），廊内整体安装进度 95%，已完成预验收。</p>		
	征迁情况	无		

	完成投资	当月完成投资额 260 万元；当月工程费用 250 万元； 年度完成投资 890 万元；年度工程费用为 810 万元； 累计完成投资 99382 万元；累计工程费用 66815 万元； 累计完成工程费用 98.2%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无

