

城建重点工程进度 20211025

截止到 2021 年 10 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港密路（桔乡路～峡州大道）：

项 目 基 本 信 息	工程简介	港密路快速路长 4.4 公里，红线宽 26～59 米。（一标段）：包含高架桥 4 座，其中跨桔乡路高架桥共长 229.4m，跨三峡高速高架桥共长 580.4m，K6+130 高架桥共长 108m，K6+335 高架桥共长 138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长 366.39m，峡州大道互通含 5 座匝道桥，共长 1409m，跨朝阳路中桥 1 座，长 56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。		
	施工单位	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司 二标段：湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2019 年 3 月		
	可研批复 投资	132067 万元	初设批复 投资	143140 万元
	财政评审 投资	59545.57 万元	工程费用	50461.93 万元
	工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 桥梁工程： 桥梁主体结构已全部完成。 2. 道路工程： 路基土石方开挖及回填已完成；机动车道路路基水泥碎石稳定层累计完成 41.18 万平方米（41.18 万平方米），占比 100%；机动车道沥青混凝土面层摊铺，累计完成 25 万平方米（33.6 万平方米），占比 75%。 3. 绿化工程： 绿化工程整体累计完成 55%。 4. 交通工程： 交通工程累计完成 45%。	
征迁情况		无		
完成投资		当月完成投资：1120 万元；当月工程费用 1120 万元； 年度完成投资 17005 万元，其中年度工程费用 16652 万元； 累积完成投资 76692 万元，其中累计工程费用 41386 万元； 累计完成工程费用的 82%。		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		

推 进 存 在 问 题	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



2、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程,采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交,新建A-H共8条匝道,总长约2.58km,其中桥梁匝道3座,全长630.25米。改造及新建通道共4处。主要建设内容为:桥涵工程,排水工程,通道工程,景观工程,电力管沟等综合管线工程,附属工程(照明、交通及治安监控等)的管线预埋。		
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019年11月		
	可研批复投资	38250万元	初设批复投资	38385万元
	财政评审投资	14172.51万元	工程费用	12641.7万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程: 桩基累计完成94根(94根),占比100%;承台累计完成21座(24座),占比87.5%;墩柱累计完成14座(19座),占比74%;桥台累计完成4座(5座),占比80%;现浇箱梁累计完成1联(4联),占比25%;钢箱梁架设完成1联(2联),占比50%;防撞护栏累计完成150m(1260.5m)占比12%。</p> <p>2、路基土石方工程: 开挖累计完成57万m³(57万m³),占比100%;路基土石方填筑累计完成6.7万m³(6.7万m³),占比100%。</p> <p>3、其他: 箱涵累计完成4座(4座),占比100%;A、G匝道已开放试通行;E匝道已竣工验收并完成移交。</p> <p>4、绿化工程: A、G、E匝道绿化区域施工累计完成100%;正在进行E、F匝道夹角区域绿化施工。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资: 711万元,其中工程费用711万元; 年度完成投资: 3692万元,其中工程费用3300万元; 累积完成投资: 11077万元,其中工程费用6925万元; 累积完成工程费用的54.8%。		
项 目	前期问题	无		


推 进 存 在 问 题	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



3、三峡快速路互通立交-花溪路节点互通工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	三峡快速路互通立交-花溪路节点互通工程总规划建设 8 条匝道，本次施工范围分别为 A、B、C、D、E、F、G、JS 匝道，三峡高速方向主线全长约 2.606km；花溪路相交路方向全长约 0.701km。主要建设内容有：道路工程、桥涵工程、排水工程、电力管沟等综合管线工程、附属工程（照明、交通及治安监控等）的管路预埋及设备基础。		
	施工单位	中铁大桥局集团有限公司		
	监理单位	湖北三峡建设项目管理股份有限公司		
	开工日期	2020 年 12 月		
	可研批复投资	51003 万元	初设批复投资	49932 万元
	财政评审投资	49900 万元	工程费用	23111.1 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、道路工程:</p> <p>(1) 土石方开挖累计完成 105 万方 (140 万方)，占比 75%；边坡防护完成 3.2 万平方米，占比 17.6%。</p> <p>(2) E 匝道沥青摊铺完成 100%，边沟砌筑、路缘石安装完成 95%；</p> <p>(3) F 匝道水稳层摊铺累计完成 10%；</p> <p>(4) G 匝道边坡预应力锚索累计完成 30%。</p> <p>2、桥梁工程:</p> <p>(1) 桩基累计完成 51 根 (59 根)，占比 86%；承台累计完成 13 座 (17 座)，占比 76%；墩柱累计完成 7 座 (9 座)，占比 77%；桥台累计完成 6 座 (8 座)，占比 75%；</p> <p>(2) JS 匝道桥上部结构预制安装、防撞护栏、调平层施工完成，锥坡累计完成 50%；</p> <p>(4) F 匝道现浇箱梁浇筑完成，H 匝道桥现浇梁钢筋模板安装累计完成 90%。</p> <p>3、排水工程: 结合箱围护桩累计完成 62 根，占比 100%；旋喷桩止水帷幕累计完成 61 根，占比 100%。</p> <p>4、结构工程: H 匝道下穿通道累计完成 9%。</p>		
	征迁情况	无		

	完成投资	当月完成投资：970 万元，其中工程费用 970 万元； 年度完成投资：11942 万元，其中工程费用 8510 万元； 累积完成投资：11942 万元，其中工程费用 8510 万元； 累计完成工程费用的 36.8%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	1. 生态红线用地手续正在办理中； 2. 涉高速施工手续正在办理中。

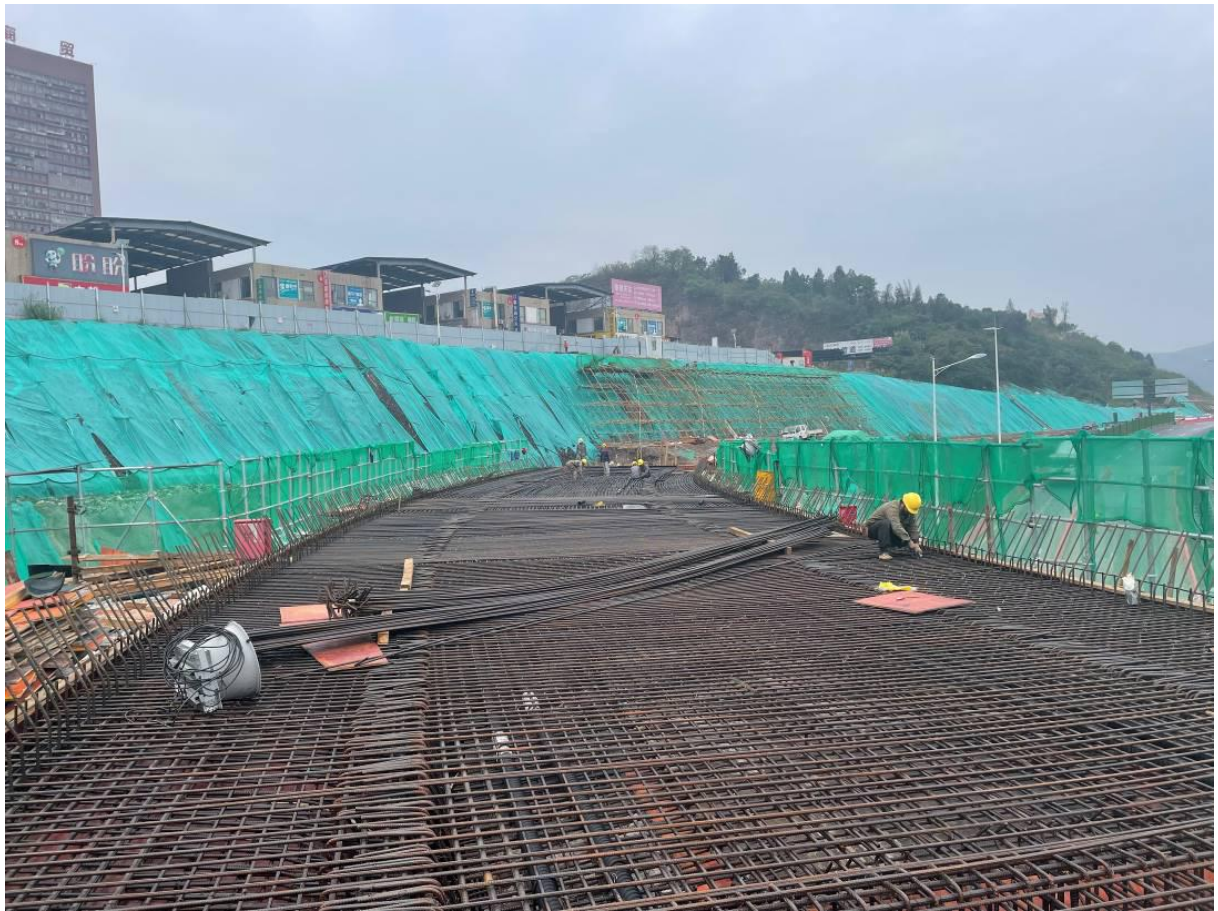

4、三峡快速路互通立交-港密路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本工程沿三峡快速路主线约 1.68km，港密路 0.83km，主要建设内容为新建全互通匝道 8 条，集散车道 2 条，桔乡路与港密路互通上下匝道 2 条。匝道及集散车道全长 4.57km，其中桥梁 2.01km，路基匝道 2.56km。主要建设内容有：道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管路预埋及设备基础等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2021 年 1 月		
	可研批复投资	52373.24 万元	初设批复投资	47985 万元
	财政评审投资	29534.4 万元	工程费用	27425.9 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程：桩基累计完成 228 根（409 根），占比 55.7%；承台累计完成 22 座（113 座），占比 19.5%；桥台墩完成 11 座（116 座），占比 9.5%。</p> <p>2、土石方：土石方累计完成 30 万方，占比 45.5%。</p> <p>3、道路工程：边坡支护累计完成 1.9 万平方（6.2 万平方），占比 30.6%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资 784 万元，其中当月工程费用 784 万元；</p> <p>年度完成投资 15488 万元，其中年度工程费用 7565 万元（含预付款）；</p> <p>累积完成投资 15488 万元，其中累计工程费用 7565 万元；</p> <p>累计完成工程费用的 27.6%。</p>		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	子项二（港密路与桔乡路互通）范围集体土地已交付；子项一（港密路与三峡快速路互通）范围已交付约 95%，需相关部门加快遗留的集体土地上 1 户房屋和三峡果蔬国有土地的征迁工作。		
	管线问题	无		
	建设问题	无		

	其他问题	无
--	------	---



5、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

项目 基本 信息	工程简介	<p>沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。</p>
----------------	------	---

	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司		
	监理单位	重庆市工程管理有限公司		
	开工日期	2016年12月		
	可研批复投资	136892万元	工程费用	74800万元
工程 形象 进度	建设进度	<p>一、截污工程：一期已完工，正在对建成管网进行排查、检修及维护，累计完成70%；截污工程二期环保销号任务已基本完成，三峡大学-大学路雨污分流完成90%、云深路雨污分流改造完成70%。</p> <p>二、市政配套工程</p> <p>(1) 道路工程：7号路级配碎石、水稳层摊铺、混凝土浇筑，底层沥青铺设完成100%；8号路级配碎石、水稳层摊铺、混凝土浇筑，底层沥青铺设完成100%；6号路排水施工完成8，路缘石安装，平石安装完成、混凝土浇筑，底层沥青铺设完成100%；1号路道路面层混凝土浇筑完成100%；</p> <p>(2) 景观喷泉工程：正在音乐进行调试，整体形象进度完成98%；</p> <p>(3) 桥梁工程：1号桥箱梁浇筑完成；2号桥箱梁浇筑完成，桥梁筑岛围堰已全部挖除，目前桥梁栏杆和地袱方案正在优化设计，待确定后实施。</p> <p>三、生态修复工程</p> <p>(1) 水体生态修复：①二区预处理区域修复完成98%，二区驳岸两边挺水植物种植完成补种98%；②三区驳岸两边挺水植物重新栽种和补种完成98%；③完成挺水植物、浮叶植物种植及修复补种97%；④新增浮床3座，目前水草种植已完成。</p> <p>(2) 生态湿地栈道栏杆、防腐木底板安装全部完成。</p> <p>四、驳岸、溢流坝工程</p> <p>(1) 驳岸绿化：①乔灌木种植累计完成95%；②草皮铺设累计完成95%。绿化整体累计完成95%；</p> <p>(2) 溢流坝工程：主体结构完成98%。</p> <p>五、景观公园工程</p> <p>景观公园工程完成土石方、苗木、种植、构筑物占比约90%。浮桥浮箱正在拼扣安装，累计完成30%。</p>		
	征迁情况	加快景观公园征拆交地工作。		
	完成投资	当月完成投资：1018万元，其中工程费用：1018万元 年度完成投资：13536万元，其中工程费用：13536万元 累计完成投资：63699万元，其中工程费用：63699万元 累计完成工程费用85.2%。		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。		

推 进 存 在 问 题	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



6、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长 11.25km（其中将军路管廊有 1.7km 及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给 PPP 项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长 6.37km。</p>		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
		湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）		
		重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）		
	开工日期	2017 年 11 月		
	可研批复投资	194413 万元	初设批复投资	187316 万元
财政评审投资	126068.68 万元（不含征迁补偿费及贷款利息）	工程费用	规模调整后：68053 万元	
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>牌坊坡路：累计完成管廊结构 1836 米（100%），廊内整体安装进度 98%；道路路基土石方工程完成 100%，道路水稳层摊铺累计完成 100%；沥青摊铺累计完成 1860 米（67%），牌坊坡路绿化种植完成 85%，人行道摊铺完成 95%，河道整治完成 20%。</p> <p>南站路管廊：累计完成管廊结构 1742 米（88%），廊内整体安装进度 85%。隧道掘进 95m、仰拱浇筑 72m，二衬浇筑 56m。</p> <p>点军路：累计完成管廊结构 2114.7 米（100%），廊内整体安装进度 100%；道路累计完成沥青摊铺 2763 米（100%）。已完成预验收。</p> <p>将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工 1130 米（100%），廊内整体安装进度 100%，已完成预验收。</p> <p>江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工 2264 米（100%），廊内整体安装进度 85%。</p>		
	征迁情况	无		

	完成投资	当月完成投资额 940 万元；当月工程费用 870 万元； 年度完成投资 10955 万元；年度工程费用为 10665 万元； 累计完成投资 97082 万元；累计工程费用 64655 万元； 累计完成工程费用 95%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无

