

## 城建重点工程进度 20250625

**截止到 2025 年 6 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**


### 1、花溪路快速化改造项目

<b>项目 基本 信息</b>	工程简介	本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约 2.56 公里，道路红线宽度 60~76 米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向 6 车道，路基宽 30 米；辅道双向 4 车道，路基宽 30 米。设计速度主线 80 公里/小时，辅道 40 公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长 245 米，新建人行地道 1 座。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	湖北虹源工程咨询有限公司		
	开工日期	2024 年 4 月 15 日		
	可研批复 投资	55545 万元	初设批复 投资	45917 万元
	财政评审 投资	29015.59 万元	工程费用	25939.99 万元
<b>工程 形象 进度</b>	建设进度	1. 跨橘乡大道高架桥主体结构全部完成；桥梁防撞护栏完成 1140m（共 2440m，变更新增），占比约 47%。 2. 辅道路基土石方开挖、填筑及新建电缆通信管沟已全部完成。 3. 雨污水管道基本完成。 4. 辅道水稳摊铺基本完成；辅道沥青第一层摊铺 2750m（共 5120m），占比约 54%。 5. 花艳一路地下通道主体结构完成。 6. 左幅人行道基层完成 80%。 7. 全线绿化工程行道树种植完成 20%。		
	征迁情况	高新区、伍家岗区均已完成用地交付。		
	完成投资	当月完成投资：4041 万元，其中工程费用 1625 万元； 年度完成投资：8230 万元，其中工程费用 5544 万元； 累积完成投资：20660 万元，其中工程费用 13004 万元； 累计完成工程费用的 50.1%。		
<b>项目 推进 存在 问题</b>	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



## 2、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，30 个子项。		
	施工单位	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司		
	监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司、湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2021 年 3 月		
	可研批复投资	38.99 亿元	初设批复投资	38.76 亿元
	财政评审投资	/	工程费用	28.23 亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 两网项目共 30 个子项，其中 10 个子项已完工，18 个子项正在加快建设，2 个子项正在开展前期工作，累计完成形象产值约 26.33 亿元。 2. 混错接改造完成 286 处（占比 72.8%）； 3. 大公桥调蓄池系统：进水箱涵、B18.2 截流井施工完成。 4. 东山水质净化厂：生产区主体结构完成 96.5%，生活区主体结构基本完成。 5. 合益下箱涵：箱涵主体结构完成。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：8740 万元； 年度完成投资：18328 万元； 累积完成投资：263328 万元。		
项 目 推 进 在 存 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

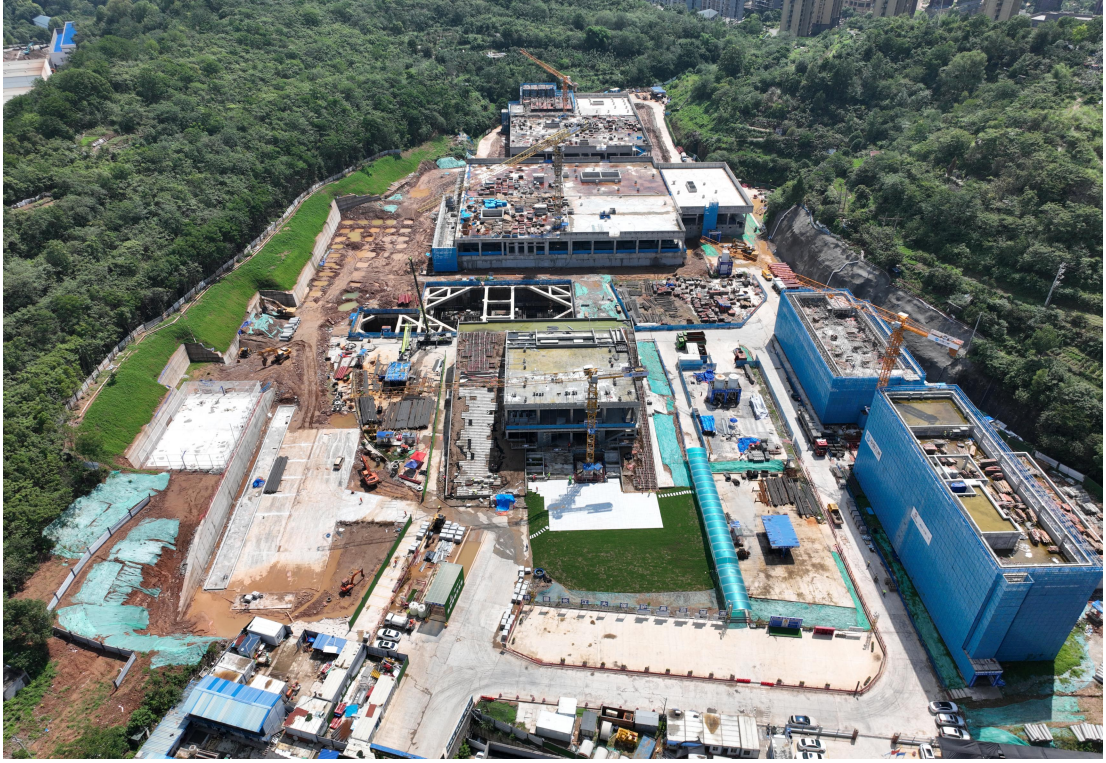

### 3、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

项 目 基 本 信 息	工程简介	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。		
	施工单位	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司		
	监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
	开工日期	2023年12月29日		
	可研批复投资	20.58亿元	初设批复投资	目前已批复:1.96亿元(5个子项)
	财政评审投资	/	工程费用	1.41亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	已完成5个子项初设批复，完成管网排查、外水溯源约1000公里；完成清淤检测约174公里；完成混错接改造82处；完成新建及管道修复约6.5公里，新建污水泵站基础2座，改造污水提升泵4座。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：2040万元； 年度完成投资：3720万元； 累积完成投资：8804万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

